

Raport de activitate 2015

Tevékenységi beszámoló 2015

Vicepreşedintele Barti Tihamér
Barti Tihamér alelnök



Consiliul Judeţean Harghita

RO - 530140 Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5
Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703
info@judetulharghita.ro, www.judetulharghita.ro

Harghita Megye Tanácsa

RO - 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám
Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703
info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro

Direcția generală investiții Beruházási vezérigazgatóság



Consiliul Județean Harghita

RO - 530140 Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5

Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703

info@judetulharghita.ro, www.judetulharghita.ro

Harghita Megye Tanácsa

RO - 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703

info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Creditate în viitor.



Proiecte și Servicii
2007-2013



SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL HARGHITA



HARGITA MEGYE INTEGRÁLT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERE



A projekt általános kerete

- Hargita Megye Tanácsa 2013 októberében egy olyan projekt finanszírozási szerződését írta alá, amelynek a kivitelezése az egész megye hulladékgazdálkodási menedzsmentjét hivatott megoldani. A szerződés aláírását többéves kitartó munka előzte meg
- A projekt áfa nélküli értéke kb. 164 millió lej. Finanszírozás:
 - 70,5%-át uniós forrásokból
 - 14,2%-át kormányalapokból
 - 15,3%-át pedig a megyei tanács költségvetéséből

A projekt célja

- Európai Uniós követelményeknek megfelelő, korszerű és fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése és működtetése Hargita megyében.
- Európai Unió előírásainak nem megfelelő városi hulladéklerakók felszámolása illetve bezárása.
- Az integrált hulladékgazdálkodási rendszer hozzá kíván járulni Hargita megye környezeti értékeinek védelméhez és javítja a lakosság életminőségét.
- A projekt beruházásaiból valamilyen szinten a megye valamennyi települése részesül Székelyudvarhely kivételével. A beruházások időtartama 13 hónap.



Érintett település: Balánbánya

- **A régi, nem EU-konform hulladéktároló teljes felszámolása**
- Befejeződött a több mint 60.000 köbméter háztartási hulladék átszállítása a csíkszeredai lerakóba
- Az ekologizálási munkálatok elvégzése a bányabezárásokat végző Conversmin RT feladata
- A munkálatok értéke 3.766.000 lej ÁFA-val.

- **Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar építése**
- 650 m² - en fekvő önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar építése befejeződött
- a 10+1 hulladékgyűjtő konténerek el vannak helyezve az udvarban
- A beruházás értéke 726.082 lej ÁFA-val.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Creație în viitor.



SMIU
IIR



Programul Național de Dezvoltare Rurală
2007-2013



30110 300 00 13 47



Érintett települések: Borszék

- A régi, nem EU-konform hulladéktároló teljes felszámolása
- A hulladéklerakó felszámolása befejeződött.
- A régi hulladéklerakó területéről (15.256 m²) kisebb felületre (12.764 m²) gyűjtötték össze, majd tömörítették az évek során itt felhalmozott háztartási hulladékot (24.250 m³).
- A beruházás értéke: 1.524.779 lej ÁFA-val.







Érintett települések: Csíkszereda

- **EU-konform hulladéktároló kialakítása**
- A munkálatok ésszerűségét a csíki medence aljzatában rejtőző vízkészletek megóvása indokolja. Ezért országos szinten is ritkaságszámba menő szigetelési munkálatokat végeztek el, amely az aljat szigeteléssel kezdődött.
- A teljes felület előkészítődött a Szentegyházáról, Balánbányáról, Székelykeresztúrról és Tusnádfürdőről átszállítandó hulladék befogadására, ami megtörtént.
- Jó ütemben halad a háztartási hulladék átrakása a Csíkszeredában létesítendő tömörítő állomás és a szelektív hulladékgyűjtő udvar felületéről.
- A beruházás értéke 16.251.493 lej ÁFA-val.



Érintett települések: Csíkszereda

- **Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar és tömörítő állomás megépítése**
- **Ennek a két létesítménynek a megépítése még nem kezdődött el, de 2016 június 30-ig be kell befejeződnie.**
- **Az önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar hasonló lesz a már megépítettekhez, értéke 729.365 lej ÁFA-val.**
- **A tömörítőállomás értéke 13.346.000 lej ÁFA-val.**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Creație în viitor.



Ministerul Mediului și Climei
2007-2013





Érintett település: Gyergyóremete

- **EU-konform hulladéktároló építése**
- Jó ütemben haladnak az építkezési munkálatok. A kivitelező ígérete szerint a munkálatok 95%-a befejeződik.
- Az első cella kimélyítése befejeződött, folyamatban van az aljatszigetelés.
- A csurgalék összegyűjtőrendszer készen van, következik a tároló medencék szigetelése.
- A csurgalék előtisztítóállomás a helyén van.
- Megérkeztek a hulladékmozgató és tömörítő gépek.
- Készen van az adminisztrációs épület kívül-belül, megérkeztek a laboratórium felszerelései is.
- A ki és bemenő sávon a mérlegek be vannak szerelve, működőképesek.
- A beruházás értéke: 28.385.000 lej, ÁFA-val.



Érintett település: Gyergyóremete

- **EU-konform hulladéktároló építése**
 - A kimenősáv autómosója üzemképes
 - A csapadékvíz nyílt sáncos összegyűjtő rendszere kiépült
 - A homoktalanító háromrekeszes ülepitő medence készen van
 - A csurgalékvíz átemelését biztosító pompaállomás készen van
 - A lerakott hulladék által termelt biogáz égetőrendszere fel van szerelve
 - A belső közműrendszerek: víz, csatorna, elektromos áram ki vannak építve
 - A 20 hektáros terület be van kerítve, közvilágítása kiépítve
 - A kerítés belső nyomvonalát követve tűzvédelmi vízvezetékrendszer és tűzcsapok vannak kiépítve.
 - Az altalajvizek minőségét figyelő kutak (6 darab) ki vannak fúrva.
 - Hátra van még az alcellák aljazának a szigetelése, két pompaállomás megépítése, és a területrendezés (faültetés, gyepesítés).



Érintett település: Gyergyóremete

- **A szelektív hulladékválogató és komposztáló állomás megépítése**
- A válogató állomás iparcsarnokának az oszlopszerkezete áll, következik a csarnok befödése és a könnyűszerkezetű oldalfalak felszerelése
- A szükséges előregyártott elemek a telepen vannak.
- Megérkeztek a válogatóállomás gépei és felszerelései (szállítószalagok, kézi válogató kabinok, zsákfeltépő szerkezet, bálázóprés, az állomást kiszolgáló homlokrakodó, a bálákat mozgató céljármű)
- A komposztáló állomás előkezelési csarnokának oszlopszerkezete áll. Az intenzív komposztáló és a komposzt érlelő munkafelületek készen állnak, le vannak aszfaltozva.
- Megérkeztek a komposztálóállomást kiszolgáló gépek és felszerelések (homlokrakodók, kamionok, nagy űrtartalmú tároló konténerek, zsákfeltépő felszerelés, válogatószalag, nagyteljesítményű aprítógép, önjáró komposztforgató, komposztrosta, stb.)
- Hátra van még a bekötőút elkészítése, az ivóvízvezeték és a villanyáram bekötéséhez szükséges kábel lefektetése. Ezek a munkálatok 2016 tavaszán fognak megvalósulni.
- A beruházás értéke 31.050.000 lej ÁFA-val.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Creație în viitor.



Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013



27. 8. 2013 8.12



1. 9. 2013 10.45



11. 9. 2013 11.36



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Credem în viitor.



Ministerul Mediului și Climei
2007-2013



3. 11. 2015 17:28



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Credem în viitor.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Credite în viitor.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
2007-2013





Érintett település: Gyergyószentmiklós

- **A nem EU-konform hulladéklerakó bezárása**
- Ez a lerakó is, a csíkszeredaihoz hasonlóan egy régi kubikgödörbe volt telepítve. Ezért a tervezettnél nagyobb felületet kell leszigetelni.
- A 2,64 hektáron elterülő lerakó kb. 125.000 m³ hulladékot tartalmaz
- Ezt újrahalmozzák és tömörítik 1,85 hektár területre, majd az egész felületet leszigetelik egy uniós szabványoknak megfelelő rétegrenddel.
- A beruházás értéke 2.350.000 lej ÁFA-val.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Creație în viitor.



Ministerul Mediului și Climei
2007-2013





Érintett település: Gyergyószentmiklós

- **Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar létesítése**
- A létesítménynek az a szerepe, hogy lehetőséget biztosítson a város lakóinak, hogy a háztartásaikban összegyűlt nagy mennyiségű szelektív hulladékot (építkezési törmelék, fanyesedék, használt autógumik, használt bútor, stb.) díjmentesen lerakhatják a megfelelő konténerekbe, csökkentve ezzel a háztartásukban összegyűlt, periodikus rendszerességgel díjszabás ellenében elszállítandó hulladék mennyiségét.
- Az udvar megépítése és felszerelése befejeződött.
- A létesítmény átadásra kész.
- A beruházás értéke: 754.000 lej ÁFA-val



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Creditate în viitor.



SMD
IIR



Ministerul Mediului și Climei
2007-2013





Érintett település: Korond

- **Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar és tömörítő állomás megépítése**
- **A beruházások megvalósítása 2015 májusában elkezdődtek.**
- **Ezeket a munkálatokat lakossági panaszra és bírósági döntéssel 2015 augusztus 20-án leállították. Felfüggesztették az építkezési engedélyt.**
- **Az igazságszolgáltatási folyamat még nem zárult le, az építkezések folytatása az elkezdett helyen bizonytalanná vált.**
- **A kialakult helyzet megoldásának a keresése folyamatban van.**
- **A tervezett beruházások értéke: 8.658.000 lej ÁFA-val.**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Credem în viitor.



Ministerul Mediului și Climei
2007-2013





Érintett település: Szentegyháza

- **Nem EU-konform hulladéklerakó felszámolása**
- A hulladék átszállítása a csíkszeredai EU-konform hulladéklerakóba befejeződött.
- Következnek az ekologizálási munkálatok.
- A beruházás értéke: lej ÁFA-val



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Creație în viitor.



Planul Național de Recuperare
2007-2013





Érintett település: Szentegyháza

- **Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar létesítése**
- Az udvar megépítése és felszerelése befejeződött.
- A létesítmény átadásra kész.
- Az önkéntes udvarra a város és környékének lakossága, ingyen lerakhatja a feleslegessé vált újrahasznosítható háztartási hulladékot.
- A beruházás értéke 748.000 lej ÁFA-val.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Credem în viitor.



Ministerul Mediului și Climei
2007-2013





Érintett település: Maroshévíz

- **Nem EU-konform hulladéklerakó bezárása**
- Ezeket a munkálatokat az indokolja, hogy a hulladéklerakó földrajzi magaslaton helyezkedik el, ahonnan a csurgalék egyértelműen a patakok és az altalajvizek irányába veszi útját, folyamatos szennyezési forrást jelentve ezekre nézve.
- A 1,4 hektáron elterülő hulladék kb. 0,7-0,8 hektár felületre tömörítették össze. A kb. 75.000 m³ háztartási hulladékot tartalmazó halom kb. 6 m magasságú lesz.
- A beruházás értéke 1.792.000 lej ÁFA-val.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiție în mediu. Credem în viitor.



Ministerul Mediului și Climei
2007-2013



19.11.2015 13:46



Érintett település: Maroshévíz

- **Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar létesítése**
- Ez a létesítmény nagyon hasznos a város lakosságának, mert ide rakhatják le **díjmentesen** a háztartásokban összegyűlt újrahasznosítható hulladékokat (pl. használt gumiabroncsok, textil, elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok, elhasználódott bútorok stb.),
- Így csökkenthető „a kapuk elé kipakolt” díjszabás ellenében elszállítandó hulladék mennyisége, így **több pénz maradhat** az állampolgárok zsebében.
- Az udvar megépítésének és felszerelésének a munkálatai befejeződtek.
- A beruházás értéke: 764.500 lej ÁFA-val.
-



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



2007-2013
Investiție în mediu. Credem în viitor.



2007-2013





Érintett település: Székelykeresztúr

- **Nem EU-konform hulladéklerakó felszámolása**
- A hulladék átszállítási munkálatok befejeződtek, következnek az ekologizálási munkálatok.
- Az áthordási munkálatokat az indokolja, hogy a Nagy-Küküllő közvetlen közelében helyezkedett el a lerakó, ami veszélyeztette a folyó vízminőségét.
- A beruházás értéke: 2.340.000 lej ÁFA-val.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Investiții în mediu. Credință în viitor.



Ministerul Mediului și Climei
2007-2013





Érintett település: Székelykeresztúr

- **Önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvar létesítése**
- A munkálatok és a felszerelések elhelyezése befejeződött.
- A kerítés, a kapu felszerelése, a közvilágítás kiépítése megtörtént. A különböző űrtartalmú gyűjtőkonténerek a helyükön vannak.
- A beruházás értéke: 754.000 lej ÁFA-val.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



2007-2013
Investiții în mediu. Credem în viitor.



SMID
SOCIETATEA SA
IMA
SOCIETATE SA



Ministerul Mediului și Climei
2007-2013





Érintett település: Tusnádfürdő

- **A hulladéktároló felszámolása**
- Az 1 hektáron elterülő 15 500 köbméteres háztartási hulladékhegyet áthordták Csíkszeredába, az EU-konform hulladéklerakóba, eleget téve az érvénybe levő uniós és hazai törvénykezésnek.
- Ezen kívül, ugyancsak a projekt keretében, Tusnádfürdőre kerül 46 darab olyan fémszerkezet, amely hozzáférhetetlenné teszi a medvék számára a hulladékgyűjtő konténereket, amelyekre igencsak nagy szüksége van a városnak.
- A beruházás értéke 716.000 lej ÁFA-val.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Principala Sursă de
2007-2013



❖ Rehabilitare DJ 132 / 132-es Megyei út Rehabilitációja

- Executarea lucrărilor rămase, respectiv: rehabilitarea a 9 buc. de poduri, realizarea covorului asfaltic pe o lungime de cc. 4,5 km, realizarea de rigole, ziduri de sprijin și montarea elementelor privind siguranța circulației, reamplasarea conductelor de utilități./

A 132-es megyei út befejezéséhez szükséges 9 híd újjáépítése, kb 4,5 km aszfaltszőnyeg leterítése, vízlevezetés megoldása, forgalombiztonsági eszközök kihelyezése, támfalak építése, közművek áthelyezése.



Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású beruházási projektek



❖ Reabilitare DJ 132 / 132-es Megyei út Reabilitációja

- Valoare totală a lucrărilor este de 57.476.979,00 lei, din care pe anul 2015 este în valoare de de 11.173.953,06 lei.

A beruházás teljes értéke 57.476.979,00 lej, szerződés értéke 11.173.953,06 lej.



Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású beruházási projektek



Coordonarea a **două proiecte** finanțate în cadrul **POR 2007-2013**, care se află în faza de implementare / Két pályázat lebonyolításának koordinálása, melyek a ROP 2007-2013 keretében nyertek finanszírozást;

❖ **Incubator de afaceri – Odorheiu Secuiesc /
Vállalkozásfejlesztő - Inkubátorház építése –
Székelyudverhely**

Faza B - Pregătirea și amenajarea terenurilor industriale reabilitate pentru noile funcții (cofinanțare 50%) / B – szakasz - A tehermentesített ipari területek új funkciókra történő előkészítése (50%-os társfinanszírozás):

- Construirea de noi clădiri sau reabilitarea, extinderea celor existente / Építkezés és a meglévő épületek bővítése, feljavítása;
- Construirea și extinderea drumurilor de acces interioare / Bekötőutak, belső közlekedési infrastruktúra építése és bővítése;



Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású beruházási projektek



- infrastructurii interioare de bază / A belső alapinfrastruktúra kiépítését, fejlesztését célzó beruházások;
- Achiziționarea dotărilor necesare funcționării centrului inovativ de dezvoltare economică / A vállalkozásfejlesztési központ működéséhez szükséges eszközökkel való felszerelés;



Valoare totală / Összérték: 7 084 473,64 lei / lej. din care valoarea lucrărilor contractate/amelyből a munkálatok szeződött értéke: **4.073.099,73** lei/lej



Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású beruházási projektek



Coordonarea implementării a **unui proiect** finanțate din cadrul programului de finanțare **POS MEDIU** / egy pályázat lebonyolításának koordinálása a Környezetvédelmi ÁOP (POS MEDIU) keretében:

Plan de Management Integrat revizuit pe principii Natura 2000 pentru Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Sit Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 / A Békás-szoros – Nagyhagymás Nemzeti Park integrált kezelési tervének felülvizsgálása a Natura 2000-es alapelvek szerint, ROSCI0027 és ROSPA0018 Natura 2000-es területek

❖ Valoare totală / Összérték: **2.416.550,04** lei;



Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású beruházási projektek



Activități realizate pentru atingerea obiectivelor proiectului:

- Realizarea studiilor preliminare elaborării planului de management;
- Elaborarea planului de management integrat revizuit pe principii Natura 2000;
- Echipamentele achiziționate pentru întărirea capacității instituționale administrației ariei protejate (de ex. quadriciclu ATV, mașină de teren 4X4, echipamente electronice, echipamente de teren și de protecție cu accesorii, echipament GIS).

A projekt fő célkitűzése érdekében megvalósított tevékenységek:

- A kezelési terv kidolgozásához szükséges előtanulmányok elkészítése;
- Az integrált kezelési terv kidolgozása a Natura 2000-es alapelvek szerint;
- Eszközök beszerzése a nemzeti park intézményi cselekvőképességének növelése érdekében (pl. négykerekű motorkerékpár, 4X4-es terepjáró, elektronikai felszerelések, terep- és védőfelszerelés, GIS felszerelés).



”Implementare de soluții de e-guvernare și registru agricol în format electronic în județul Harghita”, Cod SMIS 48432



„Elektronikus mezőgazdasági nyilvántartó és E-kormányzási rendszer megvalósítása Hargita megyében”

Ca urmare a implementării a celor trei proiecte, în valoare de cc. 1.000.000 de Euro fiecare, au fost implementate 8 servicii online, astfel sistemul informatic integrat creat asigură o gestionare eficientă a datelor în registrul agricol la nivelul comunelor.

Az egyenként **1.000.000 eurót** érő pályázatok által 8 on-line közzolgáltatás áll majd az állampolgárok rendelkezésére. Az új informatikai rendszer az önkormányzatok mezőgazdasági nyilvántartásának kezelését is megkönnyíti.



”Implementare de soluții de e-guvernare și registru agricol în format electronic în județul Harghita”, Cod SMIS 48432



„Elektronikus mezőgazdasági nyilvántartó és E-kormányzási rendszer megvalósítása Hargita megyében”

În total au fost 45 de UAT-uri partenere /Összesen **45 település** érintett megyei szinten.

Fiecare UAT partener în proiect a primit în utilizare echipamente IT după cum urmează / A projektben részt vevő önkormányzatok, egyenként, saját használatra kapnak:

- 1 buc. Switch;
- 1 buc. Router;
- 1 buc. Server;
- 4-5 buc. PC/ asztali számítógépet;
- 4-5 UPS / szünetmentes tápegységet;
- 1-2 buc tabletă;
- 1 buc copiator multifuncțional / multifunkcionális fénymásolót;
- 1-2 buc. Imprimantă / nyomtatót;
- 1 buc. imprimantă mobilă / hordozható nyomtatót;
- pentru utilizare comună 15 buc. Aparatură GPS / közös használatra 15 GPS-rendszert.



Proiecte de investiții finanțate din fonduri UE / EU-s finanszírozású beruházási projektek

- Proiecte de investiții în valoare totală de peste / Beruházási projektek több mint **15.000.000,00** euró értékben;
- Întruniri de lucru și colaborarea cu Organismele Intermediare, Autoritățile de Management, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru / Kapcsolattartás és megbeszélések - a Közvetítő és a Lebonyolító Hatóságokkal, valamint a Közép Régió Fejlesztési Ügynökséggel;
- Întocmirea Rapoartelor de progres și a Cererilor de rambursare / Tevékenységi jelentések és elszámolási dokumentációk összeállítása.



Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene / Megyei úthálózat rehabilitása és konszolidációja



DJ 134A Kissolymos – Ősoimușu Mic

I. Szerződés - 960 m 998.451,72 lei ÁFA-val / cu TVA, ebből
kifizetve 2014-ben 305.166,69 lei ÁFA-val / cu TVA

2015-ben hozzávetőleg 480.000,00 lei lesz kifizetve

II. szerződés – 3884 m 4.031.859,13 lei ÁFA-val / cu TVA,
Valoarea lucrărilor / A munkálatok összértéke:

4.031.859,13 lei ÁFA-val / cu TVA, jelenleg földmunkát
végez a kivitelező, Viaduct KFT / în momentul prezent

firma Viaduct execută lucrări de fundații



DJ 123D Sântimbru Băi – Büdösfürdő

- Valoarea contractată în anul 2015/A 2015-ös évben leszerződött összeg: **4.681.102,65 lej**
- Lungimea drumului în reabilitare/Felújítandó útszakasz hossza 5,8 km;
- Lucrări executate pe 3 km/Elvégzett munkálatok 3 kilométeren: strat de balast 20 cm, piatră spartă 15 cm, șanțuri de pământ, podețe / 20 cm balaszt réteg, 15 cm törtkő, sáncok és átereszek;



2. DJ 132A Merești - Homoródalmás

Új híd építése Homoródalmáson/ Construirea unui pod nou din tablă ondulată corugată.
Összesen a beruházás értéke: 439.413,30 lej/
Valoarea totală a investiției este 439.413,30 lei.



Pod pe drumul județean DJ 123F între localitățile Ciba și Ciceu / Híd a DJ123F megyei úton az Olt folyó fölött, Csicsó és Csiba helységek között.



Proiectat: SC Roial CDV G2 SRL Suceava Executant: SC Via Pont Invest SRL Iași Valoarea lucrărilor : 1.116.000,00 lei cu TVA (are finanțare din PNDL) Începutul lucrării : septembrie 2014 Lucrările încă se continua. Până la data de azi au fost executate lucrări în valoare de 128.160,13 lei cu TVA. /

A hidat tervezte: Royal CDV G2 KFT Suceava

A munkálat kivitelezője : Via Pont Invest Iasi A

beruházás értéke : 1.116.000,00 lej A munkálatok

kezdése : 2014 szeptembere A munkálatok jelenleg is folytatodnak.

Az eddig elvégzett munkálatok értéke : 128.160,13 lej



Realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții și refacerea mantinelei și a plexiglasului din incinta Patinoarului artificial din Gheorgheni / A gyergyószentmiklósi műjégpálya hűtési rendszerének tervezése és kivitelezése játéktér illetve a palánk modernizálása

A gyergyószentmiklósi jégpálya hűtésrendszerének felújítására, valamint a palánk cseréjére a Megyei Tanács a költségvetésből 2.430.000 lejt különített el, ami a beruházás 90 %-a. A Gyergyói Tanács a költségvetéséből 270.000 lejt különített el, ami a beruházás 10 %-a.

A beruházás értéke 2.422.299,79 lej, amiből a Megyei Tanács: 2.180.069,79 lejt, és a Gyergyói tanács 242.230 lejt fizetett, és a jégpálya hűtésrendszerének felújítása valamint a palánkjának cseréjéből áll.

A munkálat 2014 októberben megkezdődött és 2015 februárban befejeződött. A beruházásra 2014-ben 2.248.806,70 lejt valamint 2015-ben 173.493,09 lejt fizettünk ki. A műszaki átvétel után, Hargita Megye Tanácsa a saját köztvagyonát képező beruházást Gyergyószentmiklós ügykezelésébe adta.





Valoarea investiției este de 2.422.299,79 lei din care **Consiliul Județean Harghita** a asigurat finanțarea lucrărilor din bugetul local al județului Harghita în cota parte de 90% din valoarea investiției, adică **2.180.069,79 lei**, iar **Municipiul Gheorgheni** a asigurat cofinanțarea lucrărilor din bugetul local al municipiului Gheorgheni în cota parte de 10% din valoarea investiției adică 242.230 lei și include lucrările de proiectare și execuție pentru realizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea sistemului de producere și răcire a gheții prin schimbarea sistemului de producere și răcire a gheții din incinta patinoarului artificial existent prin înlocuirea echipamentelor frigorifice, realizarea unei noi piste de patinoar, schimbarea mantinelei și a plexiglasului, schimbarea băncii de rezerve și băncii de pedeapsă din incinta Patinoarului artificial. Lucrarea a fost începută în anul 2014 și finalizată în anul 2015. Pentru această investiție în anul 2014 a fost alocat suma de 2.248.806,70 lei iar în anul 2015 suma de 173.493,09 lei.





Lucrările tubulaturii instalațiilor de ventilare, aferente investiției Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház rehabilitációja és felújítása

Proiecte de investiții în valoare totală de peste / Beruházási projektek több mint **15.000.000,00** értékben

Din care Tubulatura:

Prețul este de 2.560.659,52 lei / A szerződés értéke 2.560.659,52 lej ÁFA-val. Realizarea lucrării în termen de 60 de zile lucrătoare 31 ianuarie 2016/ beruházás megvalósítása 60 munkanap 2015 január 31.





Modernizarea centralei termice și reparații capitale la rețelele termice exterioare aferente Spitalului de Psihiatrie Tulgheș / A Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórház hőközpontjának és a hőelosztó hálózatának a korszerűsítési munkálatai

Proiectant : Total Proiect SRL Od. Secuiesc Executant: SC
Fast Eco SA București Valoarea proiectului : 5.146.000,00 lei
cu TVA Plăți efectuate: 4.304.030,00 lei cu TVA

Începutul lucrărilor : mai 2014

Lucrarea încă nu s-a terminat

Tervezte : a Total Proiect KFT Székelyudvarhely Kivitelező:

Fast Eco KFT Bukarest A beruházás értéke : 5.146.000, 00 lej

Az eddigi kifizetések értéke : 4.304.030,00 lej

A munkálat kezdete : május 2014

A munkálat még nem fejeződött be, átadás előtt áll.



RK invelitoare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş / A Gyergyótölgyesi Pszichiátriai Kórháznál végzett tetőjavítási munkálatok



Proiectant: SC Industrie –Bau SRL M-Ciuc în colaborare cu SC Pecta SRL Od. Secuiesc Constructor: SC Gheconstar SA Gheorgheni, contract cu nr. 27823/12.12.2014 Valoarea contract: 93.446,40 lei cu TVA Începutul lucrărilor: ianuarie 2015 Sfârşitul lucrărilor: martie 2015 /

Tervezte : Industrie –Bau KFT Csíkszereda és a Pecta KFT Székelyudvarhely Kivitelezte : Gheconstar KFT Gyergyószentmiklós

A beruházás értéke : 93.446,40 lej93.446,40 A munkálatok kezdete : 2015 január A munkálatok befelyezése : 2015 március




A 134 A Tibod - Tibód

Tervezés + kivitelezés szerződésünk van a Viaduct KFT vel a Tibód környékén keletkezett földcsuszamlások által okozott károkat helyrehozandó/ Contract de proiectare și execuție cu executantul Viaduct SRL pentru refacerea a 500 m drum județean, afectat de ploile abundente din 2014-2015.

200 m-re van sürgősségi Építkezési engedélyünk, itt dolgoztak, helyreállították a beszakadt részt/ Avem Autorizație de Construire cu urgență pentru 200. Cu aceasta s-a remediat surparea de mal ivită în octombrie 2015.

Ezenközben készül a terv. Majd a kész tervvel lehet az egész 500 m-en dolgozni/ Între timp se elaborează proiectul, conform căruia se va lucra pe cei 500 m.

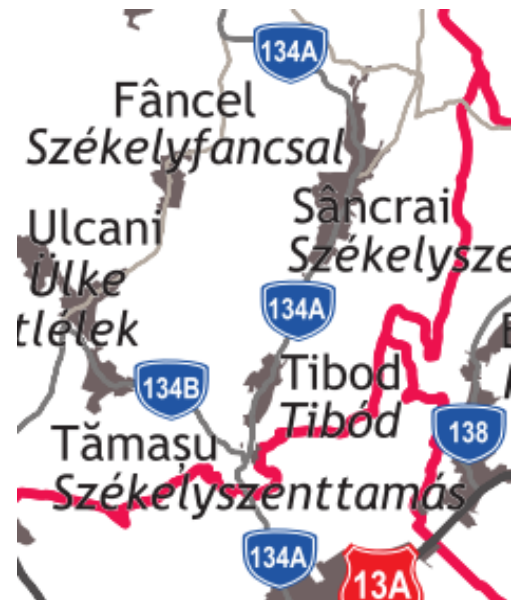


Investiții privind reabilitarea și consolidarea drumurilor județene / Megyei úthálózat rehabilitása és konszolidációja

DJ 136A: Atia - Atyha

Atyhárol elindulva a nemzeti útig hozzávetőlegesen 6 km utat hoznánk megyei út szintűre/
Modernizarea a aproximativ 6 km, lucrările începând din Atia.

Az összberuházás 5 és millió lejbe kerülne, amiből a mostani szerződés értéke 898.607,42 lej Áfával/
Valoarea totală a investiției ≈ 5.500.000 lei.
Contractul în vigoare este de 898.607,42 lei.
A kivitelező a Multipland SRL - executant.

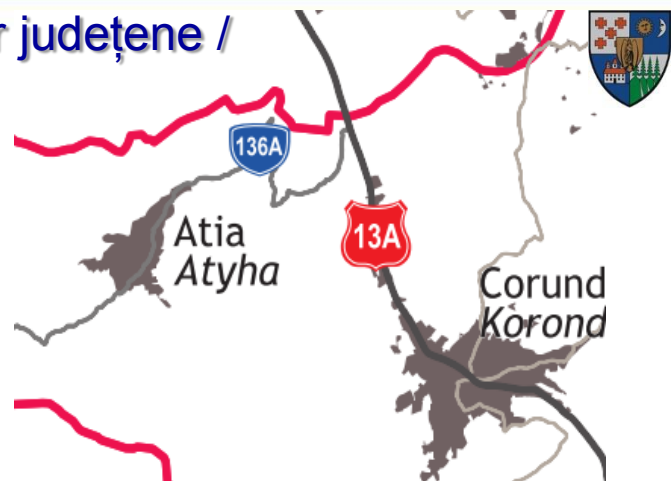

A 121G megyei úton levő támfalak megerősítése, Jakabfalva Consolidare zid de sprijin pe DJ 121G, Iacobeni

Érintett szakasz: km 0+550, km 2+600, km 7+300, összesen 270 m útmegerősítés,
támfalépítés / Zonele afectate: km 0+550, km 2+600, km 7+300, total consolidare drum/
construire zid ede sprijin 270 m

Szerződés – érték – kivitelező : 15/23725/12.10.2015 – 682.000 lej (ÁFÁ-val) – Viaduct
kft. Székelyudvarhely / Contract – valoare – executant : 15/23725/12.10.2015 – 682.000
lej (inclusiv TVA) – Viaduct srl. Odorheiu Secuiesc

Kivitelezési idő: 6 hónap / Durata de execuție : 6 luni

Munkálatok jelenlegi helyzete: megkezdődtek a drénezési munkálatok / Stadiul realizării
lucrărilor: sunt începute lucrările de drenaj



Program de electrificare în județul Harghita / Villamosítási program Harghita megyében



Település	Beruházás értéke	Villanyvezeték 20 kV	Villanyvezeték 0,4 kV	Transzformátor	Oszlop	Elosztódoboz
Borzont (Alfalu) II szakasz	308.749,46	2,7	2,24	1	10	4
Galócás (Galócás)	59.440,63	0	0,59	0	11	6
Bakó pataka, Sikaszó (Zetelaka)	21.118,69	0	0,54	0	8	
Rovát pataka, Sikaszó (Zetelaka)	242.980,80	3,84	0,61	1	0	4
Somkőháta zóna, (Lövete)	387.746,76	9,82	0,49	1	0	8
Total anyagvásárlás	1.020.036,34	27,88	5,12	5	41	22



Realizarea investițiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate sau parțial neelectrificate din județul Harghita, în anul 2015



Consiliul Județean Harghita în anul 2015 în cadrul programului „Realizarea investițiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate sau parțial neelectrificate din județul Harghita”, a achiziționat utilaje, echipamente și materiale electrice în valoare de **727.158,38 lei** pentru următoarele investiții:

1. Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa II – în care pentru realizarea investiției Consiliul Județean Harghita a asigurat în anul 2014 cablu subteran de medie tensiune în lungime de 2432 ml, cablu subteran de joasă tensiune în lungime de 2235 ml, conductor de joasă tensiune în lungime de 377 ml, un post de transformare cu transformator și 4 cutii de distribuție în valoare de 292.877,46 lei, respectiv în anul 2015 a asigurat 10 bucăți stâlpi de beton în valoare de 15.872,00 lei. Lucrarea a fost finalizată și valoarea totală a investiției este de 633.571,04 lei.
1. Reabilitarea rețelei electrice Gălăuțaș, etapa II - în care pentru realizarea investiției Consiliul Județean Harghita a asigurat conductor de joasă tensiune în lungime de 590 ml, 10 bucăți stâlpi de beton respectiv 4 cutii de distribuție în valoare de 59.440,63 lei. Lucrarea a fost finalizată și valoarea totală a investiției este de 162.750,92 lei.
1. Electrificare Șicasău, zona Rovat Pataka, comuna Zetea – în care pentru realizarea investiției Consiliul Județean Harghita a asigurat conductor de joasă tensiune în lungime de 540 ml respectiv 8 bucăți stâlpi de beton în valoare de 21.118,69 lei. Lucrarea a fost finalizată și valoarea totală a investiției este de 40.380,03 lei.
1. Electrificare Șicasău, zona Rovat Pataka, comuna Zetea - cablu subteran de medie tensiune în lungime de 3587 ml, cablu subteran de joasă tensiune în lungime de 615 ml, conductor de joasă tensiune în lungime de 255 ml, un post de transformare cu transformator și 4 cutii de distribuție în valoare de 242.980,80 lei. Lucrarea va fi finalizată în decembrie 2015.
1. Electrificarea zonei Somkőháta, comuna Lueta – cablu subteran de medie tensiune în lungime de 9737 ml, cablu subteran de joasă tensiune în lungime de 492 ml, conductor de joasă tensiune în lungime de 80 m alacsony feszültségű villanyvezeték, un post de transformare cu transformator și 8 cutii de distribuție în valoare de 387.746,26 lei. Lucrarea va începe în anul 2016.

Villamosítás Hargita megye villanyárammal való ellátását nélkülöző, vagy részben nélkülöző településein



2010-2015 –es években Hargita Megye Tanácsa elfogadta a „Villamosítás Hargita megye villanyárammal való ellátását nélkülöző, vagy részben nélkülöző településein” programot. A program célja a vezetékes áramot nélkülöző települések elektromos hálózatának kiépítése.

E program keretében, 2015-ben, Hargita Megye Tanácsa közbeszerzett 5 munkálatnál a szükséges anyagvásárlást **727.158,38 lej** értékben a következőképpen:

1. Borzont település villamos hálózatának kiépítése – Gyergyóalfalu község – II szakasz - melyben a munkálat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa 2014 decemberében közbeszerzett 2432 m, 20 kV feszültségű földalatti villanykábel, 2235 m alacsony feszültségű földalatti villanykábel, 377 m 20 kV feszültségű villanyvezeték, 1 db transzformátort valamint 4 darab elosztódobozt 292.877,46 lej értékben, valamint 2015-ben 10 darab villanyoszlopot 15.872,00 lej értékben. A munkálat befejeződött és a teljes beruházás értéke 633.571,04 lej.
1. Galócás település villamos hálózatának felújítása - II szakasz - melyben a munkálat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa megvásárolt 590 m hosszú alacsony feszültségű villanyvezeték, 11 villanyoszlopot valamint 6 darab elosztódobozt 59.440,63 lej értékben. A munkálat befejeződött és a teljes beruházás értéke 162.750,92 lej.
1. Bakó pataka villanyhálózatának bővítése, Zetelaka község – melyben a munkálat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa megvásárolt 540 m hosszú alacsony feszültségű villanyvezeték valamint 8 villanyoszlopot 21.118,69 lej értékben. A munkálat befejeződött és a teljes beruházás értéke 40.380,03 lej.
1. Rovát pataka villanyhálózatának kiépítése, Zetelaka község - melyben a munkálat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa megvásárolt 3587 m 20 kV feszültségű villanykábel, 615 m alacsony feszültségű villanykábel, 255 m 20 kV feszültségű villanyvezeték, 1 db transzformátort valamint 4 db elosztódobozt 242.980,80 lej értékben. A munkálat folyamatban van.
1. Somkőháta zóna villamosítása, Lövéte község – melyben a munkálat megvalósításához Hargita Megye Tanácsa megvásárolt 9737 m 20 kV feszültségű villanykábel, 492 m alacsony feszültségű villanykábel, 80 m 20 kV feszültségű villanyvezeték, 1 db transzformátort valamint 8 db elosztódobozt 387.746,26 lej értékben. A munkálatot 2016-ban fogják elkezdni.

Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă în localitățile mici din județul Harghita / Hargita megyei kistelepülések ivóvízhálózatának kiépítése és korszerűsítése



În următoarele localități / Az alábbi helységekben

Nr. crt	Denumirea lucrării	Nr. populație	Nr. gospodării	Valoarea estimată a lucrării -lei-	Valoarea alocată pentru anul 2015 -lei-
Lucrări în continuare - proiectare și execuție				206.730	206.730
1	Asigurarea sursei de apă potabilă pentru localitatea Bențid, comuna Șimonești- etapa I	144	69	115.350	115.350
2	Alimentarea cu apă a localității Nicoleşti-aducțiune, comuna Ulieș	173	72	91.380	91.380
Lucrări în continuare - execuție				203.106	203.106
3	Alimentarea cu apă a localității Ghipeș comuna Mărtiniș- etapa II	156	61	78.742	78.742
4	Alimentarea cu apă a localității Păuleni, comuna Lupeni- etapa I	226	147	124.364	124.364
Lucrări noi - execuție				271.187	271.187
5	Alimentarea cu apă a localității Păuleni, comuna Lupeni- etapa II	226	147	89.263	89.263
6	Asigurarea sursei de apă potabilă pentru localitatea Bențid, comuna Șimonești- etapa II	144	69	63.924	63.924
7	Extinderea rețelei de apă potabilă în comuna Ditrău, sat Jolotca	630	230	118.000	118.000
TOTAL				681.023	681.023

Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă în localitățile mici din județul Harghita / Hargita megyei kistelepülések ivóvízhálózatának kiépítése és korszerűsítése





Consiliul Județean Harghita

RO - 530140 Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5

Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703

info@judetulharghita.ro, www.judetulharghita.ro

Köszönjük a figyelmüket!
Vă mulțumim
pentru atenția acordată!
